Jan Plešák, DiS.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: Za správnost vyhotovení
Čas podepsání: 15.10.2026 13:49:06

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Účelem stavby **rekonstrukce povrchu silnice III/0078 v km 0,000 – 2,189**. Stavba bude rozdělena do dvou fází tak, aby byl co nejméně omezen provoz v místě Exitu 5 PS, zejména uzavření sjezdu a nájezdu na dálnici D7.

Investor: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11, 150 00 Praha 5

Odpovědná organizace (žadatel) : **Froněk spol. s r.o.**
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 475 34 630
Odpovědná osoba: Tomáš Macálka, tel. 608 772 570

Dopravní opatření bude provádět firma: **ADSUM spol. s r.o.**
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČ:451 44 991
Odpovědná osoba: Martin Frolík, tel. 777 690 022

1. fáze **Termín: 7.11. - 22.11. 2026**

- Uzavírka silnice III/0078 bude provedena v km 0,210 – 2,189 tzn. od křižovatky s nájezdem na dálnici D7 v Exitu 5 PS ke křižovatce se silnicí III/00715 v obci Velké Čičovice.
- Objízdná trasa pro směr Velké Čičovice bude vedena od místa uzavírky nájezdem na dálnici D7 v Exitu 5, dále po dálnici D7 směr Chomutov, sjezdem v Exitu 7 na silnici I/66 a dále po silnicích III/00714 a III/00715 přes Buštěhrad do Velkých Čičovic. Objízdná trasa bude vedena obousměrně pro veškerou dopravu. Vozidla, která nesmí využit dálnici mají možnost objet úsek vedený po dálnici po silnicích III. tříd přes obce Středokluky a Makotřasy.
- Sjezd ani nájezd na dálnici D7 v Exitu 5 PS nebude v této fázi uzavřen. Provoz na odpočívce/ČSPH Středokluky nebude omezen.

2. fáze **Termín: 23.11. - 30.11. 2026**

- Uzavírka silnice III/0078 bude provedena v km 0,000 – 2,189 tzn. od křižovatky se silnicí III/0077 ke křižovatce se silnicí III/00715 v obci Velké Čičovice.
- Uzavírka sjezdu a nájezdu na dálnici D7 ze silnice III/0078 v Exitu 5 PS.
- Sjezd z dálnice D7 do prostoru odpočívky/ČSPH Středokluky a nájezd zpět na dálnici D7 bude v provozu bez omezení.
- Objízdná trasa pro směr Velké Čičovice bude vedena od místa uzavírky po silnici III/0077, dále nájezdem na dálnici D7 v Exitu 5 LS směr Praha, dále otočením v Exitu 3 (silnice III/2405) směr Chomutov, pokračováním přímo v Exitu 5 směr Chomutov, sjezdem v Exitu 7 na silnici I/66 a dále po silnicích III/00714 a III/00715 přes Buštěhrad do Velkých Čičovic.
- Objízdná trasa pro směr Chomutov bude vedena od místa uzavírky po silnici III/0077, dále nájezdem na dálnici D7 v Exitu 5 LS směr Praha, dále otočením v Exitu 3 (silnice III/2405) a pokračováním směr Chomutov.
- Objízdná trasa pro sjezd z dálnice D7 v Exitu 5 na uzavřenou silnici III/0078 bude vedena pokračováním přímo směr Chomutov, pokračováním přímo v Exitu 7, dále otočením v Exitu 9 (silnice III/00719) směr Praha, pokračováním přímo v Exitu 7 směr Praha a sjezdem v Exitu 5 LS na silnici III/0077. Tato objízdná trasa bude značena i pro příjezd do skladových areálů Tuchoměřice.
- Vozidla, která nesmí využit dálnici mají možnost objet úsek vedený po dálnici po silnicích III. tříd přes obce Středokluky a Makotřasy.

Veškeré svislé i vodorovné přechodné dopravní značení musí být provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., příslušnými normami, vzorovými listy, technickými podmínkami a předpisy ŘSD (zejména PPK – PRE, PPK – VOZ, PPK SVE a R-plány /výkresy opakovaných řešení/).

Přechodné dopravní značení bude na dálnici provedeno a upraveno dle vydaného stanovení Ministerstvem dopravy po vyjádření Ministerstva vnitra ve smyslu §77 zákona č. 361/200 Sb.

Před zahájením prací musí pracovníci zhotovitele absolvovat školení BOZP u úseku bezpečnosti ŘSD a že při pohybu pracovníků na komunikaci za provozu, montáži a demontáži přechodného značení (včetně montáže a demontáže svodidel) budou dodržovány veškeré příslušné předpisy.

Zhotovitel průkazným způsobem oznámí příslušnému SSÚD přípravu/montáž/demontáž přechodného dopravního značení.

Zpracoval: Martin Frolík, tel. 777 690 022

ADSUM
Jana Balejová
Digitálně podepsal Jana Balejová
Datum: 2026.10.19 12:24:33 +02'00'
•DOPRAVNÍ ZNAČENÍ•
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ČESKOMORAVSKÁ ASOCIACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Vypracoval: Martin Frolík tel.: 777 690 022, e-mail: frolik@adsum.cz	Zodpovědný projektant, kontrola: Martin Frolík

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel (stavebník):
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

ADSUM
•DOPRAVNÍ ZNAČENÍ•
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť
provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, č.ú. 807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462

Stavba:
III/0078 VELKÉ ČIČOVICE

Objekt: Dopravně inženýrské opatření - DIO
1. fáze
Uzavírka silnice III/0078

Číslo zakázky:	DIO-189-9/2026
Datum:	říjen 2026
Stupeň:	RDS
Měřítko:	-
Počet formátů:	3xA3
Číslo přílohy: 1.	Paré:

Celková situace - 1. fáze


III/0078 Velké Čičovice - rekonstrukce vozovky

7.11.- 22.11. 2026


- UZAVÍRKA SILNICE III/0078 - 1. fáze
- UZAVÍRKA SILNICE III/0078 - 2. fáze + UZAVÍRKA D7 - EXIT 5 PS
- OBJ. TRASA UZ. - ČIČOVICE - 1. fáze
- OBJ. TRASA UZ. - ČIČOVICE - 2. fáze + UZAVÍRKA D7 - EXIT 5 PS
- OBJ. TRASA UZ. - CHOMUTOV - 2. fáze + UZAVÍRKA D7 - EXIT 5 PS
- UZAVÍRKA SILNICE III/0077 (STRABAG)
- OBJ. TRASA UZAVÍRKY - TUCHOMĚŘICE


1 Čičovice
2 Velké Čičovice
3 BUŠTĚHRAD
4 Lidice
5 Makotřasy
6 Zájezd
7 Středokluky


ADSUM

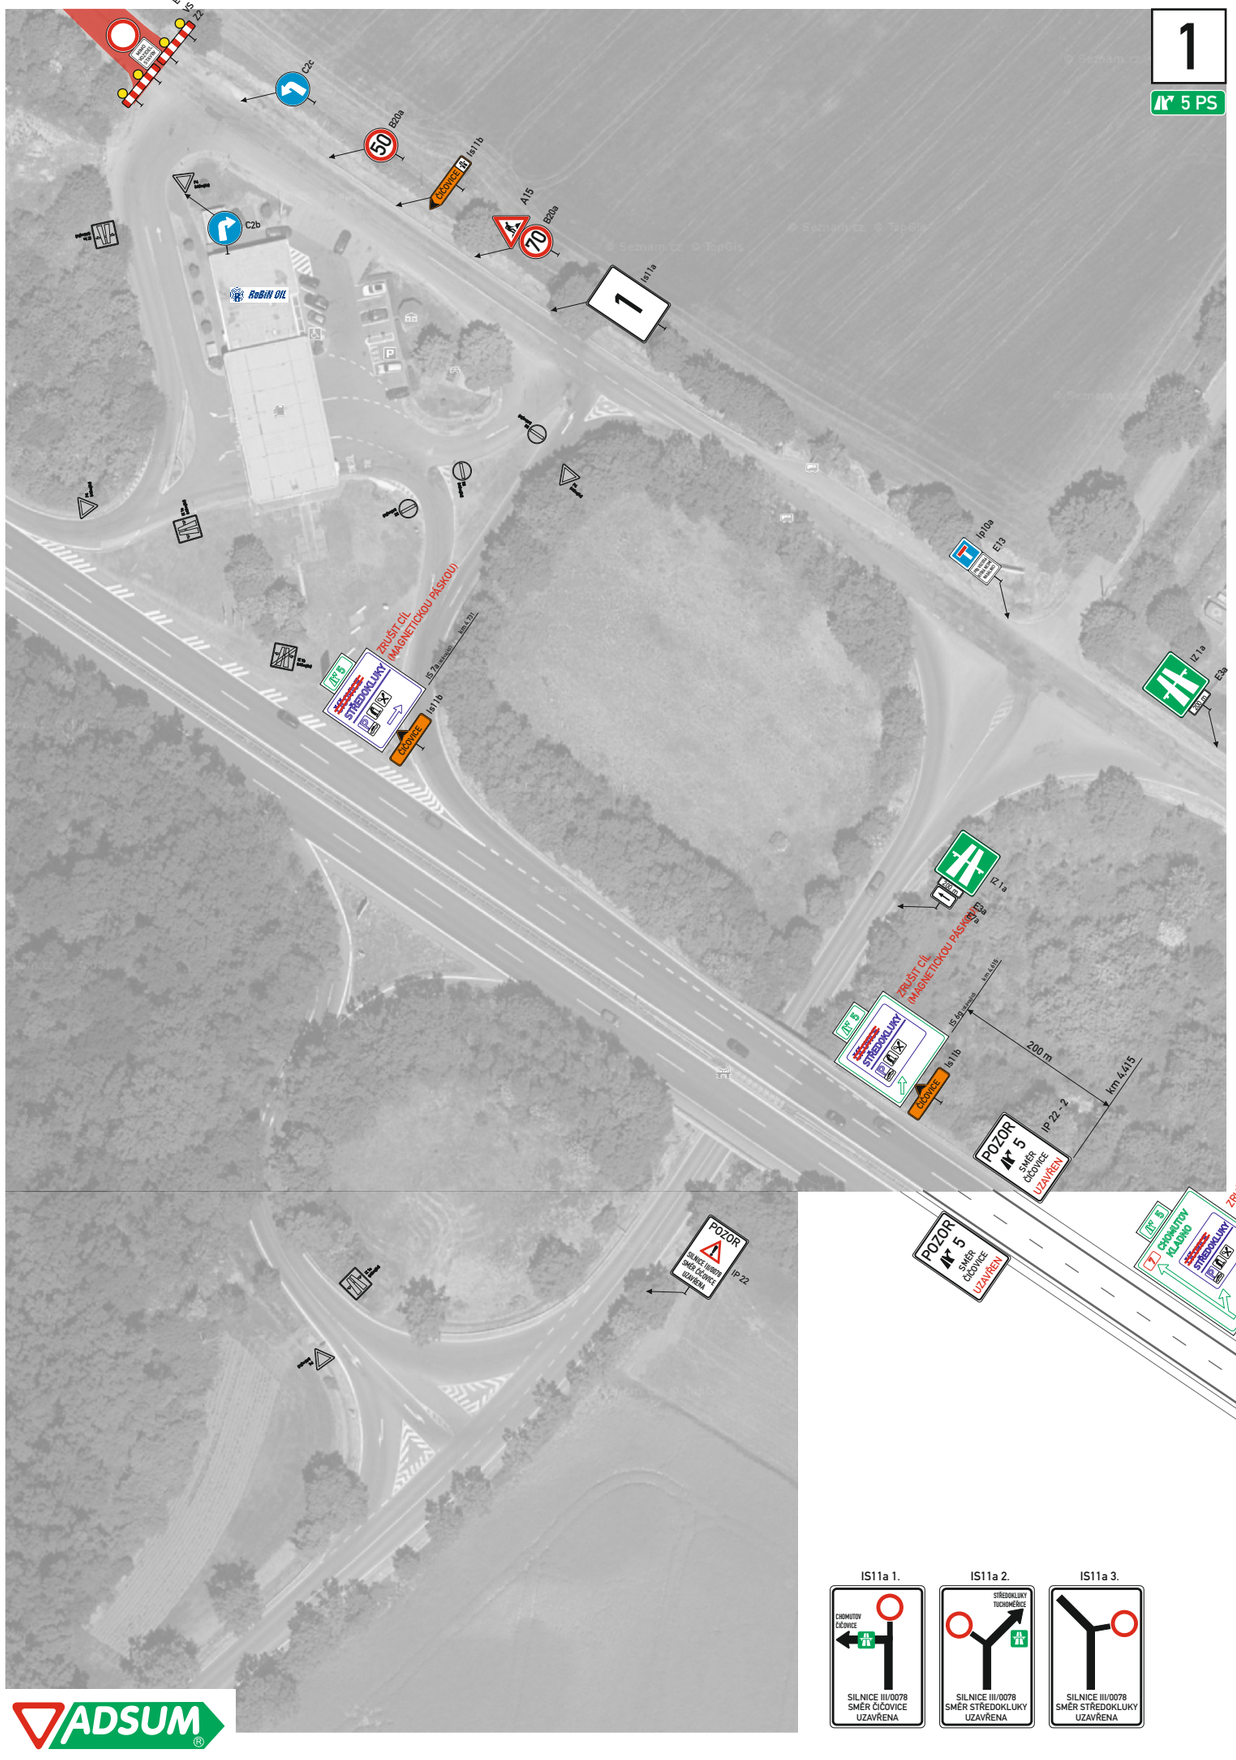




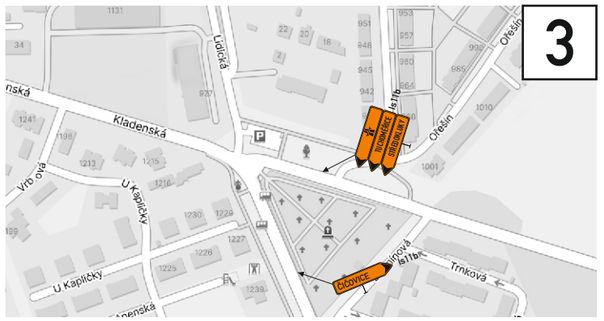

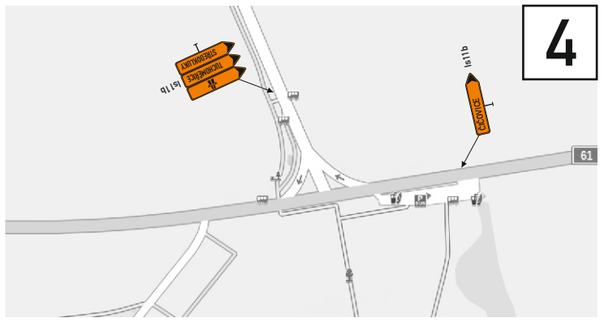

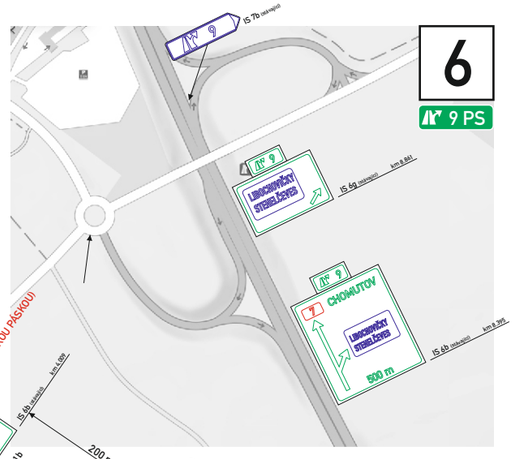



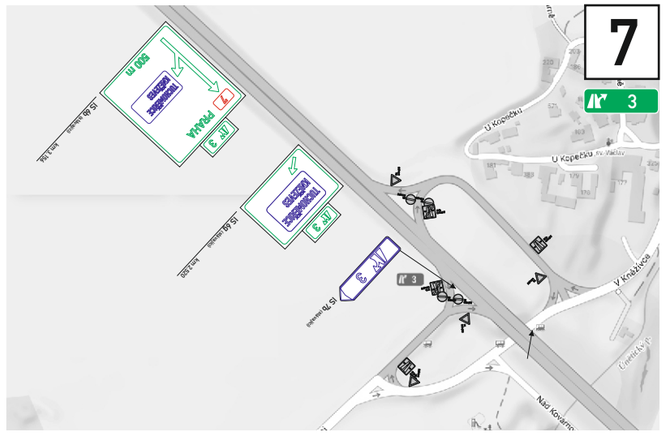

IS11a 1.

IS11a 2.

IS11a 3.

ADSUM®
